



**Vialmín EP**  
Trabajamos por la vialidad



**EMPRESA PÚBLICA DE  
MANTENIMIENTO,  
INFRAESTRUCTURA,  
VIALIDAD, AMBIENTE  
Y MINERÍA DE PAUTE  
VIALMIN EP**

**INFORME  
RENDICIÓN  
DE CUENTAS  
2022**

**PERIODO  
2022**

---



## Contenido:

¿Quiénes Somos? .....	2
Misión.....	2
Visión.....	2
ORGANIGRAMA VIALMIN EP .....	3
DESARROLLO FASE 1 .....	4
DESARROLLO FASE 2 .....	5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2021.....	5
FINANCIAMIENTO .....	6
CONCLUSIÓN .....	16
ANEXO FOTOGRÁFICO .....	17



# **EMPRESA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD, AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE VIALMIN EP**

## **¿Quiénes Somos?**

La empresa VIALMIN EP fue creada mediante ordenanza municipal en el año 2013 con el nombre de MIVIA, en el año 2014 mediante Reforma a la Ordenanza de Creación de la empresa se cambia de nombre a VIALMIN EP. En el año 2017 comienza sus actividades productivas con 8 funcionarios 2 administrativos y 6 operativos. En el año 2022 la empresa trabaja con normalidad con todo el personal esto es con 5 administrativos y 6 operadores, compartiendo un mismo fin común, el cual, es el desarrollo y crecimiento de la empresa.

### **Misión**

Establecer y ejecutar políticas para implementar un sistema integrado de regulación control y gestión del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, a través del uso de tecnología (sistema inteligente de manejo de tráfico), que permita la integración armoniosa de todos los entes demandantes de movilidad que redunde en mejorar la calidad de vida y la preservación del medio ambiente.


### **Visión**

Satisfacer la demanda de los servicios de forma sostenible logrando ser una empresa de referencia a nivel local y nacional, en los trabajos de mantenimiento, infraestructura, vialidad, ambiente y minería, sustentado en una alta competitividad, mediante una imagen empresarial destacada, manteniendo un personal altamente calificado, motivado y comprometido en sus objetivos de trabajo.



## **ORGANIGRAMA VIALMIN EP:**

El organigrama que se presenta a continuación fue aprobado por el Directorio de VIALMIN EP, con el objetivo de desarrollar de manera eficiente los procesos administrativos de la Institución, considerando que cada cargo debe cumplir funciones específicas detalladas en cada perfil.

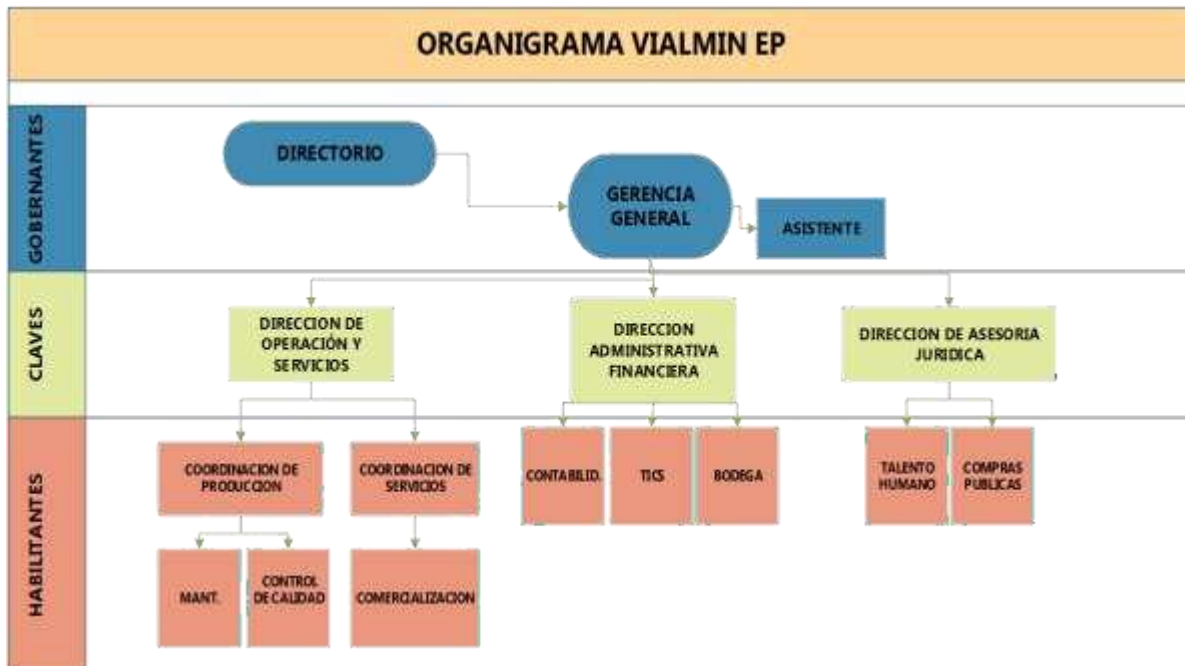



## **DESARROLLO FASE 1**

La empresa pública VIALMIN EP habilitó diferentes canales digitales con el objetivo de llegar con la información a una mayor cantidad de personas.

Con fecha, 23 de marzo de 2023, se reúne el equipo de trabajo para conocer la designación para el proceso de Rendición de Cuentas, mismo que está conformado por los siguientes funcionarios:

- Ing. Edwin Fernando Moscoso Sarmiento **REPRESENTANTE LEGAL**
- Ing. Andrés Fernando Carmona Chica **RESPONSABLE DEL PROCESO**
- Ing. Katherine Alexandra Vásquez Ortega **RESPONSABLE DE CARGAR LA INFORMACIÓN**

Con fecha, 24 de marzo de 2023 se publicó en la página web y Página oficial de Facebook, un formulario para que la Ciudadanía elabore preguntas de los temas de interés para la deliberación de la Rendición de Cuentas 2022, con ello se elaborará el Informe Final. Para constancia verificar el siguiente link: <https://www.vialminep.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuentas-2021/> dicho procedimiento concluyó el día 31 de marzo de 2023.

## **DESARROLLO FASE 2**

### **CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2022**

#### **FINANCIAMIENTO:**

##### **1. Ingresos. -**

Durante el año 2022, VIALMIN EP dispuso de los siguientes ingresos, para la ejecución de sus actividades y cumplimiento de objetivos propuestos a enero 2022.

#### **RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO INGRESOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2022**

*Tabla 1 Ejecución presupuestaria ingresos*

<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 1,001,361.02</b>
Venta de bienes y servicios	\$ 982,890.54	
Maquinaria y Equipo	\$ 13,120.00	
Vehículos	4,845.00	
Ingresos de bienes provenientes chatarrización	\$ 0.00	
Otros ingresos	\$ 505.48	



**EMPRESA PUBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD,  
AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE VIALMIN-EP**

Rendición de Cuentas 2022

<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>\$ 21,376.00</b>
Fondos de Autogestión	\$ 0.00	
Cuentas pendientes por cobrar	\$ 0.00	
Anticipos por devengar	\$ 21,376.00	
<b>TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2022</b>		<b>\$ 1,022,737.02</b>

**2. Gastos e inversión. –**

VIALMIN EP para dar cumplimiento a los diferentes contratos durante el año 2022, contrajo obligaciones con terceros por diferentes rubros, como se muestra en el siguiente resumen:

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2021**


*Tabla 2 Ejecución presupuestaria gastos*

<b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>		<b>\$ 1,117,607.37</b>
Gasto en personal	\$ 152,034.93	
Gasto en servicios	\$ 278,910.73	
Gasto en bienes	\$ 37,092.80	
Gasto en obras de infraestructura	\$ 637,068.91	
Gasto en seguros y comisiones	\$ 8,163.61	
Gasto en transferencias a entidades del presupuesto general del estado	\$ 3,530.89	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$ 54,262.64</b>
Pasivo Circulante	\$ 54,262.64	



**TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2021 \$ 1,171,870.01**

### EJECUCION PRESUPUESTARIA

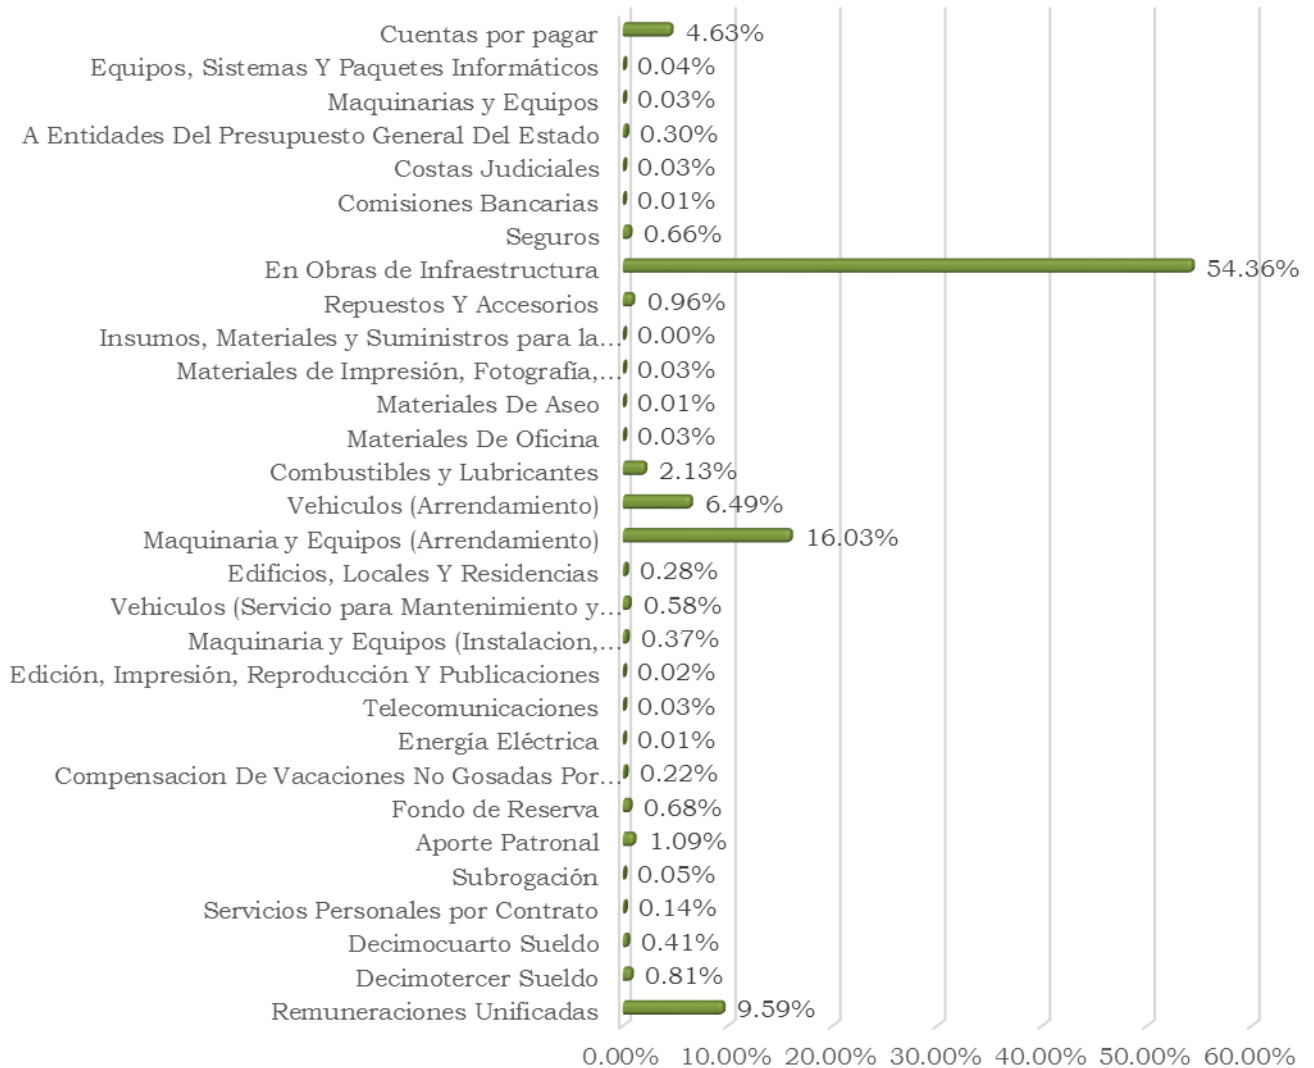

**Observaciones:** La tabla 1 y 2 muestran la ejecución presupuestaria del año fiscal 2022, en donde se obtiene como resultado final un déficit presupuestario de USD 149,132.99. Cabe mencionar a que existen proyectos que han sido ejecutados, pero no se afectó presupuestariamente por no existir aun el comprobante de venta respectivo, por lo que, solamente se recibió el anticipo respectivo., mismos que forman parte del presupuesto del año 2023.

**Nota:** Datos tomados del Reporte de la Ejecución Presupuestaria generada por el Sistema Ofimático SIG-AME.



## **OBRAS REALIZADAS 2022**

### **1. ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA LAS VÍAS EFECTUADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DENTRO DEL CENTRO PARROQUIAL, FASE 3**

Firma del contrato: 10 de diciembre de 2021

Fecha de inicio de trabajos: 21 de diciembre de 2021

Plazo de ejecución: 60 días.

Fecha de terminación de la obra: 18 de febrero de 2022

Monto del contrato: 50,606.38

Monto ejecutado: 50,606.38



**2. MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ASFALTO DE LA CALLE  
JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ, DEL BARRIO EL FLORESTAL DE LA  
PARROQUIA SAN JOAQUÍN DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, CON  
RECURSOS CORRESPONDIENTES A REDISTRIBUCIÓN  
EQUITATIVA SOCIAL DELEGADA DE LA COMPETENCIA VIAL  
RURAL AÑO 2020**

Firma del contrato: 15 de diciembre de 2021

Fecha de inicio de trabajos: 5 de enero de 2022

Plazo de ejecución: 45 días.

Fecha de terminación de la obra: 18 de marzo de 2022

Monto del contrato: 53,282.14

Monto ejecutado: 53,271.14



### **3. ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL CANTÓN PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY**

Firma del contrato:	1 de febrero de 2022
Fecha de inicio de trabajos:	2 de febrero de 2022
Plazo de ejecución:	5 meses.
Fecha de terminación de la obra:	30 de junio de 2022
Monto del contrato:	160,640.00
Monto ejecutado:	160,639.50



#### **4. BACHEO ASFÁLTICO DE VARIAS VÍAS DE LA PARROQUIA RICAURTE CANTÓN CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY**

Firma del contrato:	15 de febrero de 2022
Fecha de inicio de trabajos:	23 de febrero de 2022
Plazo de ejecución:	45 días.
Fecha de terminación de la obra:	4 de abril de 2022
Monto del contrato:	94,058.25
Monto ejecutado:	94,094.30





## **5. SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETES**

Firma del contrato: 10 de marzo de 2022

Fecha de inicio de trabajos: 10 de marzo de 2022

Plazo de ejecución: 424 horas.

Fecha de terminación de la obra: 9 de mayo de 2022

Monto del contrato: 16,112.00

Monto ejecutado: 4,845.00



## **6. SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA Y RODILLO LISO VIBRATORIO**

Firma del contrato:	16 de marzo de 2022
Fecha de inicio de trabajos:	16 de marzo de 2022
Plazo de ejecución:	416 horas.
Fecha de terminación de la obra:	14 de mayo de 2022
Monto del contrato:	35,360.00
Monto ejecutado:	2,370.00




## **7. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA EL MIRADOR-CEMENTERIO-EL TABLÓN Y MURO DE GAVIONES**

Firma del contrato:	15 de marzo de 2022
Fecha de inicio de trabajos:	24 de marzo de 2022
Plazo de ejecución:	60 días.
Fecha de terminación de la obra:	20 de abril de 2022
Monto del contrato:	113,079.55
Monto ejecutado:	113,069.31



## **8. PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE CALLE JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ, DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN-FASE 1**

Firma del contrato:	29 de abril de 2022
Fecha de inicio de trabajos:	12 de mayo de 2022
Plazo de ejecución:	90 días.
Fecha de terminación de la obra:	9 de agosto de 2022
Monto del contrato:	113,079.55
Monto ejecutado:	113,069.31

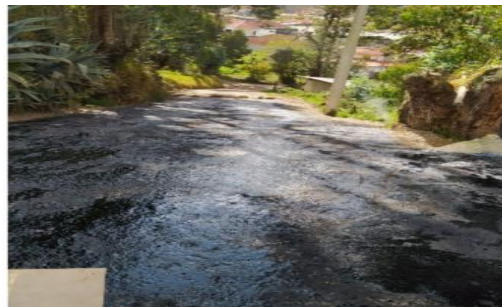

**9. ESTABILIZACIÓN DE LA CALLE 1 Y 2 DEL BARRIO VIRGEN DE  
LA NUBE, PARA LA COLOCACIÓN DEL DOBLE TRATAMIENTO  
SUPERFICIAL BITUMINOSO**

Firma del contrato: 19 de mayo de 2022  
Fecha de inicio de trabajos: 29 de mayo de 2022  
Plazo de ejecución: 10 días.  
Fecha de terminación de la obra: 29 de mayo de 2022  
Monto del contrato: 97,384.81  
Monto ejecutado: 75,124.69



**10. MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE LASTRE EN LA  
PARROQUIA RURAL DE SHAGLLI CON LOS RECURSOS DEL  
MANTENIMIENTO VIAL DEL AÑO 2021**

Firma del contrato:	15 de junio de 2022
Fecha de inicio de trabajos:	12 de julio de 2022
Plazo de ejecución:	60 días.
Fecha de terminación de la obra:	26 de septiembre de 2022
Monto del contrato:	71,030.52
Monto ejecutado:	71,027.34





**11. SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA  
REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL DENTRO DEL  
CANTÓN PAUTE**

Firma del contrato: 22 de agosto de 2022  
Fecha de inicio de trabajos: 22 de agosto de 2022  
Plazo de ejecución: 2 meses.  
Fecha de terminación de la obra: 20 de octubre de 2022  
Monto del contrato: 133,860.00  
Monto ejecutado: 133,860.00



**12. MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ASFALTO DE LA CALLE JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ, DEL BARRIO EL FLORESTAL DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, CON RECURSOS CORRESPONDIENTES A REDISTRIBUCIÓN EQUITATIVA SOCIAL DELEGADA DE LA COMPETENCIA VIAL RURAL AÑO 2020”.**

Firma del contrato: 15 de diciembre de 2021  
Fecha de inicio de trabajos: 04 de enero de 2022  
Plazo de ejecución: 45 días.  
Fecha de terminación de la obra: 03 de marzo de 2022  
Monto del contrato: 53,282.14  
Monto ejecutado: 53,271.14





## **CONCLUSIÓN**

VIALMIN EP es una empresa creada para satisfacer la demanda de los servicios en materia vial, infraestructura, ambiente y minería de manera eficiente, generando a su vez, empleo y dinamizando la economía local. El trabajo en equipo por parte del Talento Humano de la empresa, podrá lograr el desarrollo y crecimiento de esta, por eso, diariamente estamos en la ardua tarea de ofertar nuestros servicios a las personas naturales como jurídicas, y así, cumplir los objetivos propuestos. Durante el año 2021, se buscaron nuevas estrategias con el fin de obtener recursos económicos. VIALMIN EP seguirá trabajando para formar el Paute que queremos.





# EMPRESA PUBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD, AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE VIALMIN-EP

Rendición de Cuentas 2022

5 respuestas

Mensaje para los encuestados

No se muestran respuestas en este formulario.

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Preguntas y Atributos:

- E-mail
- Nombre
- Apellido
- Categoría
- Puesto
- Cargo
- Sector
- Municipio

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

No se muestran más respuestas en el formulario RENDICIÓN DE CUENTAS 2021. Prueba a publicar un comentario con el comentario del formulario si crees que se perdió el post.

Google Forms



# EMPRESA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD, AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE VIALMIN-EP

Rendición de Cuentas 2022

